



A CERCA DEL AVANCE SEMANA 02

Durante la semana 2 de trabajo en el Parque Residencial Oro Negro Atardecer, se logro un avance significativo en la Torre B, puesto que dos de las actividades representativas como los son el lavado y la aplicación de pintura llegaron a un 50% de ejecución. Es importante tener en cuenta que la actividad de instalación de cortagoteras en balcones será la que marcara una ruta crítica en la programación de las siguientes semanas a desarrollar.

A continuación se adjunta la información del avance de obra de la semana 02 y el acumulado hasta la fecha.



**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4856,00	44%	2138,56	16%	770,46	0%	0	0%	0	59,9%	2909,02
TOTAL	4856,00	44,04%	2138,56	15,87%	770,46	0,00%	0,00	0%	0	59,91%	2909,02

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0%	0	0%	0	0,9%	42,00
TOTAL	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0,00%	0,00	0%	0	0,94%	42,00

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4856,00	23%	1119,17	28%	1377,72	0%	0	0%	0	51,4%	2496,89
TOTAL	4856,00	23,05%	1119,17	28,37%	1377,72	0,00%	0,00	0%	0	51,42%	2496,89

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2


SELLAMIENTO DE VENTANAS

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1021,38	20%	208,74	9%	94,50	0%	0	0%	0	29,7%	303,24
TOTAL	1021,38	20,44%	208,74	9,25%	94,50	0,00%	0,00	0%	0	29,69%	303,24

AVANCE DE OBRA - LAVADO DE FACHADA


AVANCE LAVADO DE FACHADA		
TORRE B	59,91%	40,1%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
2909,02	4856,00	1946,98

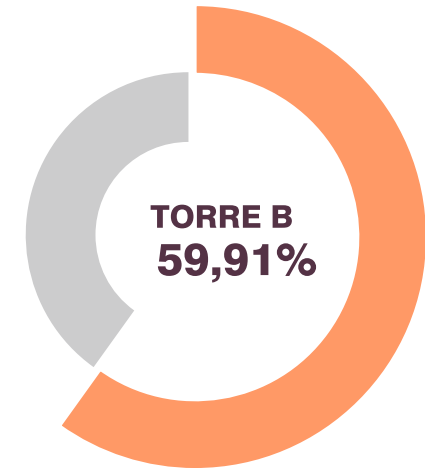


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
44,04%	2138,56

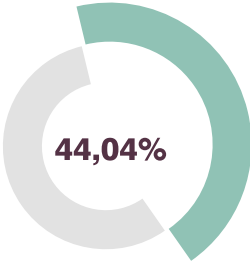


SEMANA 02	M2
15,87%	770,46



SEMANA 04	M2
0,00%	0,00



SEMANA 03	M2
0,00%	0,00




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADAS

FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT		
B	1	405,06	100%	405,06	0%	0,00	100%	405,06
B	2	148,13	100%	148,13	0%	0,00	100%	148,13
B	PF1	501,62	100%	501,62	0%	0,00	100%	501,62
B	3	53,96	100%	53,96	0%	0,00	100%	53,96
B	4	84,70	100%	84,70	0%	0,00	100%	84,70
B	5	237,09	100%	237,09	0%	0,00	100%	237,09
B	6	96,25	0%	0,00	100%	96,25	100%	96,25
B	7	136,92	0%	0,00	100%	136,92	100%	136,92
B	8	90,48	0%	0,00	100%	90,48	100%	90,48
B	9	237,09	0%	0,00	100%	237,09	100%	237,09
B	10	59,68	0%	0,00	100%	59,68	100%	59,68
B	11	150,05	0%	0,00	100%	150,05	100%	150,05
B	12	405,45	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	13	239,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	708,00	100%	708,00	0%	0,00	100%	708,00
B	14	44,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	686,11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	127,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	54,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	77,59	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	311,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4856,00	44,0%	2138,56	15,9%	770,46	60%	2909,02

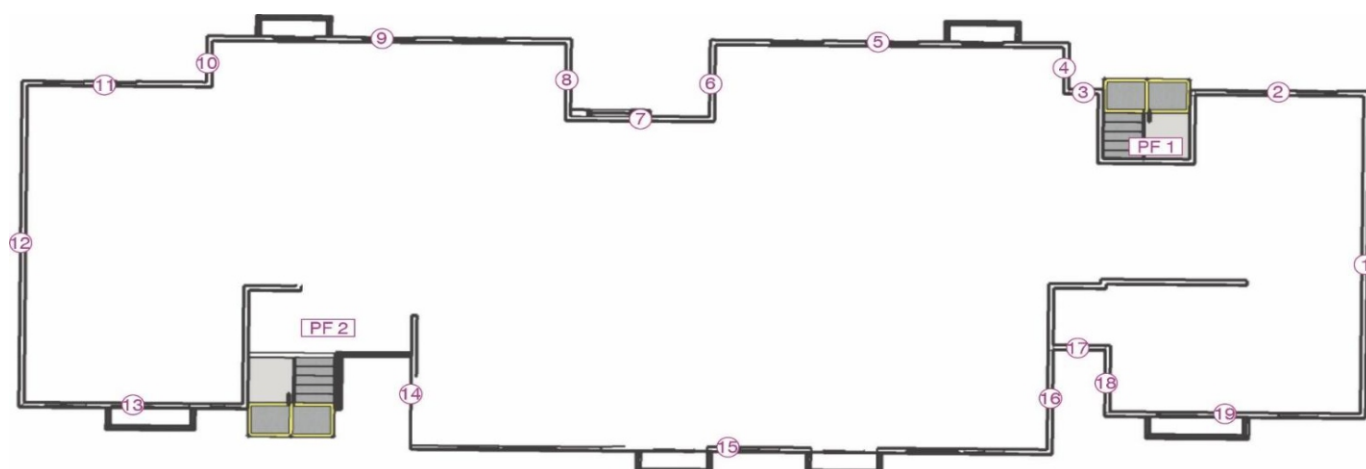


RESANE DE GRANIPLAST

MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA			AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	1	5	405,06	0,25%	1,00			1,75%	7,10
		6	405,06	0,12%	0,50				
		8	405,06	0,27%	1,10				
		11	405,06	0,37%	1,50				
		14	405,06	1%	3,00				
				1,75%	7,10				
B	2	14	148,13	1,35%	2,00			1,35%	2,00
B	5	2	207,39	0,48%	1,00			9,02%	17,90
B	5	4	207,39	0,58%	1,20				
B	5	5	207,39	0,48%	1,00				
B	5	6	207,39	0,58%	1,20				
B	5	7	207,39	0,48%	1,00				
B	5	8	207,39	0,87%	1,80				
B	5	9	207,39	0,48%	1,00				
B	5	10	207,39	0,48%	1,00				
B	5	11	207,39	0,72%	1,50				
B	5	12	207,39	0,48%	1,00				
B	5	13	207,39	0,58%	1,20				
B	5	14	207,39	0,48%	1,00				
B	5	15	207,39	0,96%	2,00				
				9,02%	17,90				
TOTAL			4458,78	0,61%	27,00	0,0%	0,00	0,61%	27,00

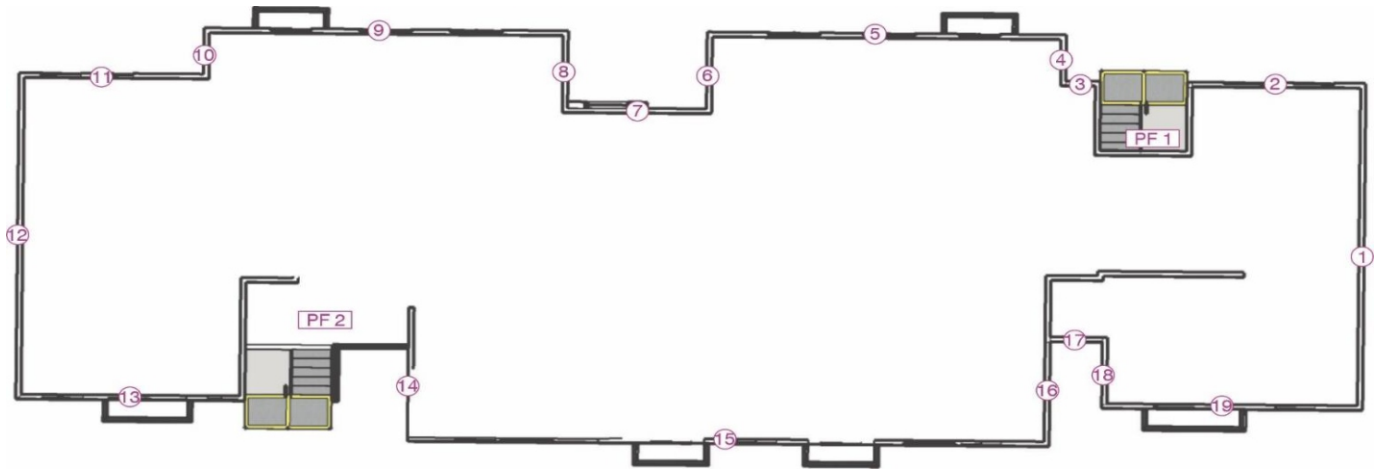


MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA			AREA	SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	6	3	96,25	3,12%	3,00			3,12%	3,00
	7	2 al 15	136,92	5,11%	7,00			5,84%	8,00
		5	136,92	0,73%	1,00				
	8	3	90,48	1,11%	1,00			4,42%	4,00
		6	90,48	1,11%	1,00				
		7	90,48	1,11%	1,00				
		15	90,48	1,11%	1,00				
TOTAL			4458,78	0,34%	15,00	0,0%	0,00	0,34%	15,00

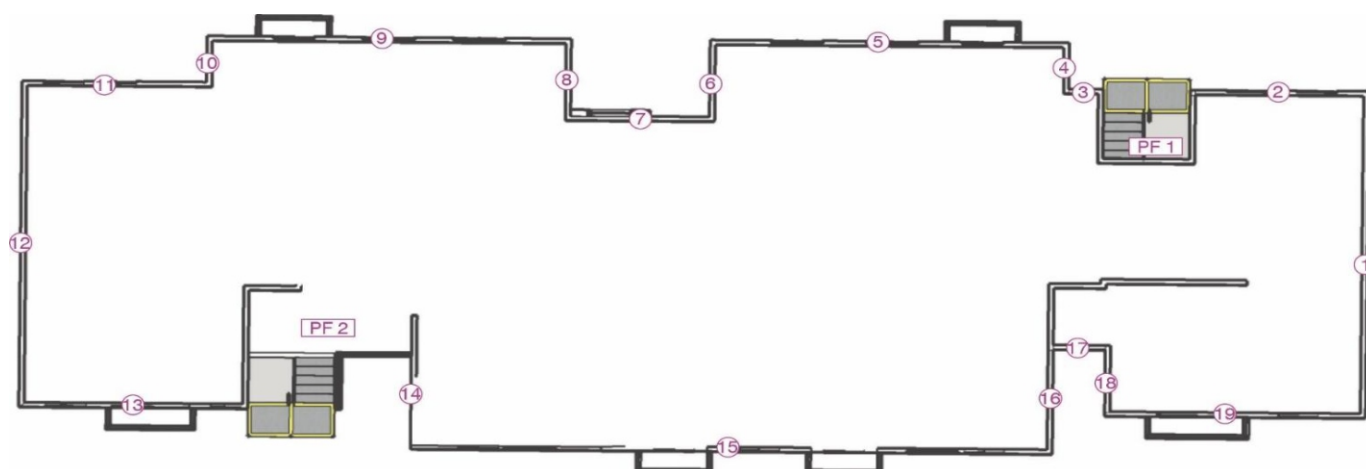


AVANCE DE OBRA - PINTURA DE FACHADA

AVANCE PINTURA DE FACHADA

TORRE B 51,42% 48,6%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
2496,89	4856,00	2359,11

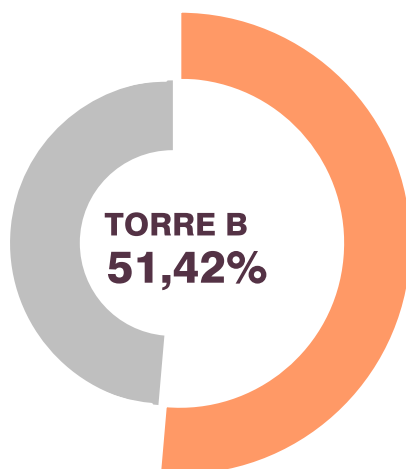


PORCENTAJE ACUMULADO

SEMANA 01

M2

23,05%

1119,17

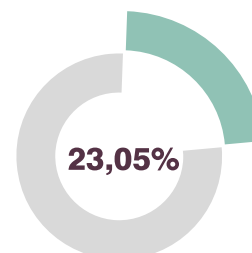


SEMANA 02

M2

28,37%

1377,72

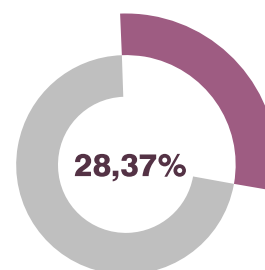


SEMANA 04

M2

0,00%

0,00




SEMANA 03

M2

0,00%

0,00




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADAS


FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT		
B	1	405,06	100%	405,06	0%	0,00	100%	405,06
B	2	148,13	0%	0,00	100%	148,13	100%	148,13
B	PF1	501,62	75%	376,22	25%	125,41	100%	501,62
B	3	53,96	0%	0,00	100%	53,96	100%	53,96
B	4	84,70	50%	42,35	50%	42,35	100%	84,70
B	5	237,09	50%	118,55	50%	118,55	100%	237,09
B	6	96,25	0%	0,00	100%	96,25	100%	96,25
B	7	136,92	0%	0,00	50%	68,46	50%	68,46
B	8	90,48	0%	0,00	50%	45,24	50%	45,24
B	9	237,09	0%	0,00	50%	118,55	50%	118,55
B	10	59,68	0%	0,00	50%	29,84	50%	29,84
B	11	150,05	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	12	405,45	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	13	239,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	708,00	25%	177,00	75%	531,00	100%	708,00
B	14	44,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	686,11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	127,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	54,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	77,59	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	311,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4856,00	23,0%	1119,17	28,4%	1377,72	51,42%	2496,89

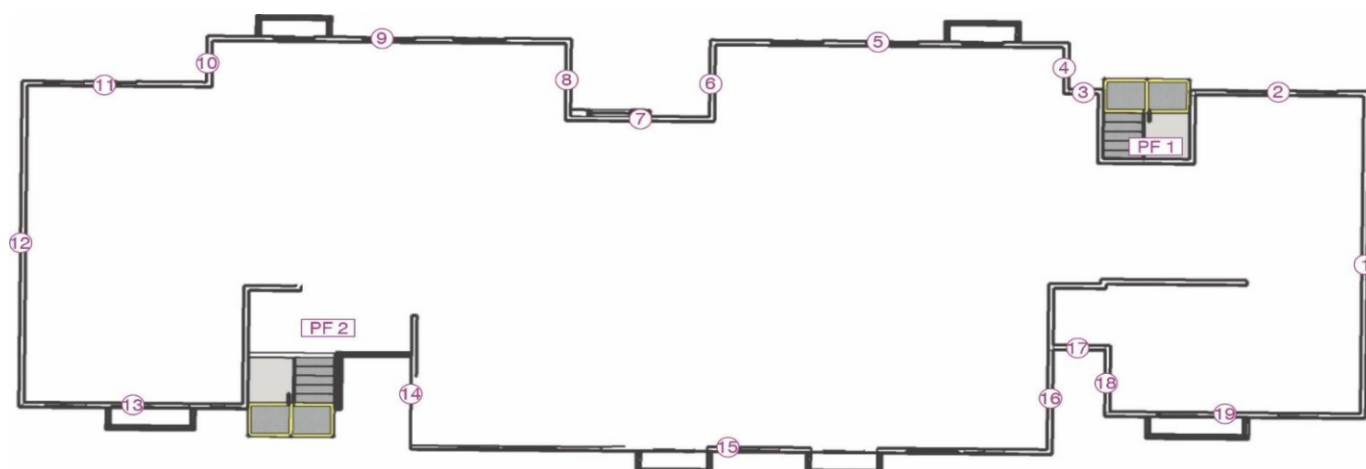

AVANCE DE OBRA - SELLAMIENTO DE VENTANAS


AVANCE SELLAMIENTO VENTANAS		
TORRE B	29,69%	70,3%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
303,24	1021,38	718,13

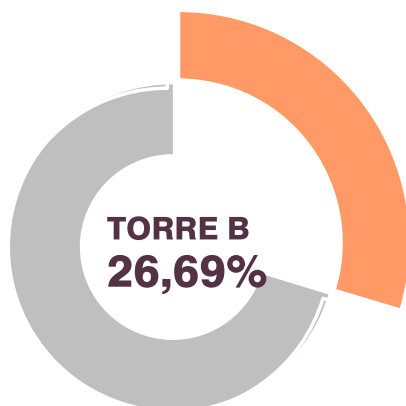


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
20,44%	208,74




SEMANA 02	M2
9,25%	94,50




SEMANA 04	M2
0,00%	0,00



SEMANA 03	M2
0,00%	0,00



MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA ORO NEGRO TORRE B - 2024								
							UNIDAD : ML	
SELLAMIENTO DE VENTANAS								
FACHADA		ML	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT		
B	1	20,25	75%	15,19	0%	0,00	75%	15,19
B	2	126,00	75%	94,50	0%	0,00	75%	94,50
B	PF1	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	3	6,08	75%	4,56	0%	0,00	75%	4,56
B	4	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	5	126,00	75%	94,50	0%	0,00	75%	94,50
B	6	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	7	62,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	8	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	9	126,00	0%	0,00	75%	94,50	75%	94,50
B	10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	11	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	12	20,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	13	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	14	73,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	315,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	20,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		1021,38	20,4%	208,74	9,3%	94,50	29,69%	303,24

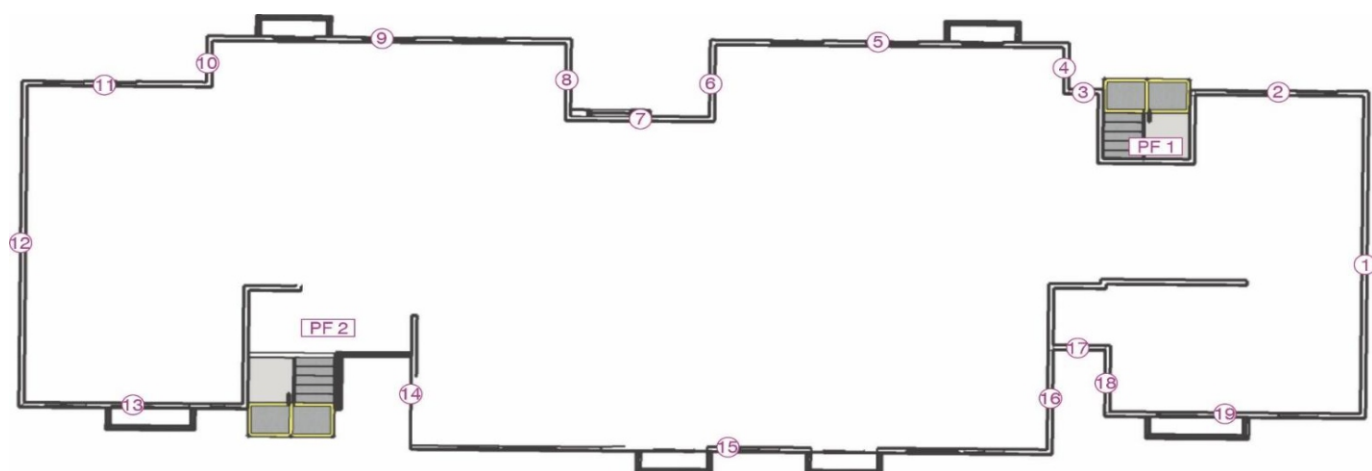

RENDIMIENTO PERSONAL



ACTIVIDADES REALIZADAS | AVANCE DE OBRA

EMILIO ÁLVAREZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	44,44	
MARTES	8,00	3,00	0,00	0,00	3,00	14,81	El empastado fue aplicado doble. Resane de cartera debajo de alfajía
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	59,65	
JUEVES	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	23,96	
VIERNES	4,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	
	17,00	3,00	50,02	0,00	44,00	187,71	

SEBASTIÁN CARDONA

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	22,22	
MARTES	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	
MIÉRCOLES	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Permiso medio día
SÁBADO	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	
	13,00	7,00	0,00	0,00	0,00	142,01	

JOHAN BERMÚDEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	Pintura en punto fijo escaleras
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	Examen médico después de las 3:00 p.m.
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
VIERNES	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Yulima, después de medio día
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Yulima
	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,10	

RENDIMIENTO PERSONAL



DEIVER GRANADA

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	
MARTES	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
JUEVES	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	

JHONATAN BENÍTEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26,98	Permiso después de las 3:00 p.m.
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	42,35	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	
VIERNES	5,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	
	5,00	0,00	50,02	0,00	30,00	236,94	

JOSÉ PEROZO

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió
MARTES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	49,75	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Incapacitado
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Incapacitado
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Incapacitado
	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	49,75	

RENDIMIENTO PERSONAL



GREGORIO GONZÁLEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Yulima
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Yulima
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,03	
JUEVES	8,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	Además hizo cobertura de 14 balcones
	8,00	0,00	109,70	0,00	28,00	60,74	

CAMILO LÓPEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	233,17	0,00	0,00	0,00	
MARTES	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	177,82	0,00	0,00	0,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Estuvo en obra Ozono después de medio día
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Ozono
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
	0,00	0,00	560,74	0,00	2,00	0,00	

ROBINSON MARÍN

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	Pintura en punto fijo escaleras
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	Pintura en punto fijo escaleras
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	Pintura en punto fijo escaleras
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	Estuvo en obra Ozono después de medio día
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Ozono
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75	

INVENTARIO DE MATERIALES



Agosto 17 del 2024

INVENTARIO MATERIALES ORO NEGRO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	IMPATEXTURA ACRILICO CUÑETE
6	ACRONAL 50% TEXILAN GALÓN
3	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - NIEVE EN LOS ALPES
5	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - GRIS BASALTO
2	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - FINAS HIERBAS
10	RODILLO ANTIGOTA EXTERIOR 9 PINTUCO
5	FELPA ANTIGOTA EXTERIOR 9"
0,5	ICOLATEX MAT BLANCO
6	ESTUCA PAÑETE SIKA X 25KG
4	CINTAS ENMASCARAR
13	BROCHAS DE 2"
