



A CERCA DEL AVANCE SEMANA 03

En el desarrollo de la semana 3 de trabajo en el Parque Residencial Oro Negro Atardecer, el equipo de trabajo FRESH HOUSE, LLEGO al 60% de ejecución de la torre B. La programación de la actividad instalación de cortagoteras en parte inferior de balcones, queda para el inicio de la semana 04.

A continuación se adjunta la información del avance de obra de la semana 03 y el acumulado hasta la fecha.

ELABORADO POR
ALEXIS BETANCOURT



**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4856,00	44%	2138,56	16%	770,46	8%	405,45	0%	0	68,3%	3314,47
TOTAL	4856,00	44,04%	2138,56	15,87%	770,46	8,35%	405,45	0%	0	68,26%	3314,47

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0,68%	30,50	0%	0	1,6%	72,50
TOTAL	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0,68%	30,50	0%	0	1,63%	72,50

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4856,00	23%	1119,17	28%	1377,72	11,45%	556,20	0%	0	62,9%	3053,09
TOTAL	4856,00	23,05%	1119,17	28,37%	1377,72	11,45%	556,20	0%	0	62,87%	3053,09

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

SELLAMIENTO DE VENTANAS


FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1156,38	27%	309,99	8%	94,50	4,67%	54,00	0%	0	39,6%	458,49
TOTAL	1156,38	26,81%	309,99	8,17%	94,50	4,67%	54,00	0%	0	39,65%	458,49

AVANCE DE OBRA - LAVADO DE FACHADA

AVANCE LAVADO DE FACHADA

TORRE B 68,26% 31,7%


CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
3314,47	4856,00	1541,53

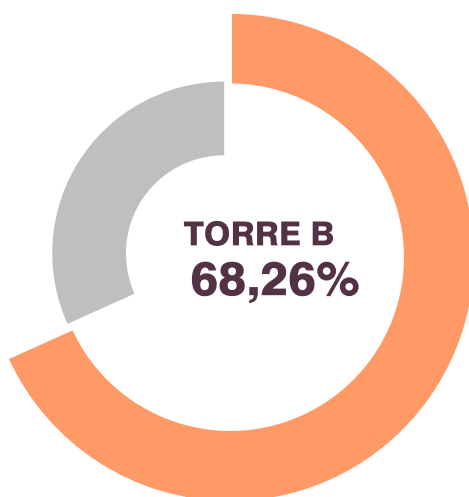

PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01 M2

44,04% 2138,56

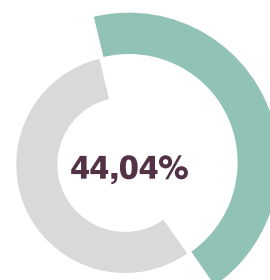


SEMANA 02 M2

15,87% 770,46

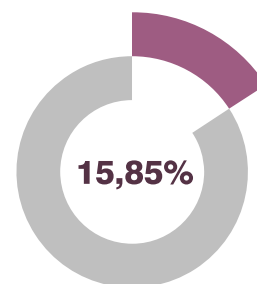


SEMANA 04 M2

0,00% 0,00



SEMANA 03 M2

8,35% 405,45




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADAS

FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	405,06	100%	405,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	405,06
B	2	148,13	100%	148,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	148,13
B	PF1	501,62	100%	501,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	501,62
B	3	53,96	100%	53,96	0%	0,00	0%	0,00	100%	53,96
B	4	84,70	100%	84,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	84,70
B	5	237,09	100%	237,09	0%	0,00	0%	0,00	100%	237,09
B	6	96,25	0%	0,00	100%	96,25	0%	0,00	100%	96,25
B	7	136,92	0%	0,00	100%	136,92	0%	0,00	100%	136,92
B	8	90,48	0%	0,00	100%	90,48	0%	0,00	100%	90,48
B	9	237,09	0%	0,00	100%	237,09	0%	0,00	100%	237,09
B	10	59,68	0%	0,00	100%	59,68	0%	0,00	100%	59,68
B	11	150,05	0%	0,00	100%	150,05	0%	0,00	100%	150,05
B	12	405,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	405,45	0%	405,45
B	13	239,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	708,00	100%	708,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	708,00
B	14	44,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	686,11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	127,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	54,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	77,59	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	311,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4856,00	44,0%	2138,56	15,9%	770,46	19,0%	405,45	68%	3314,47

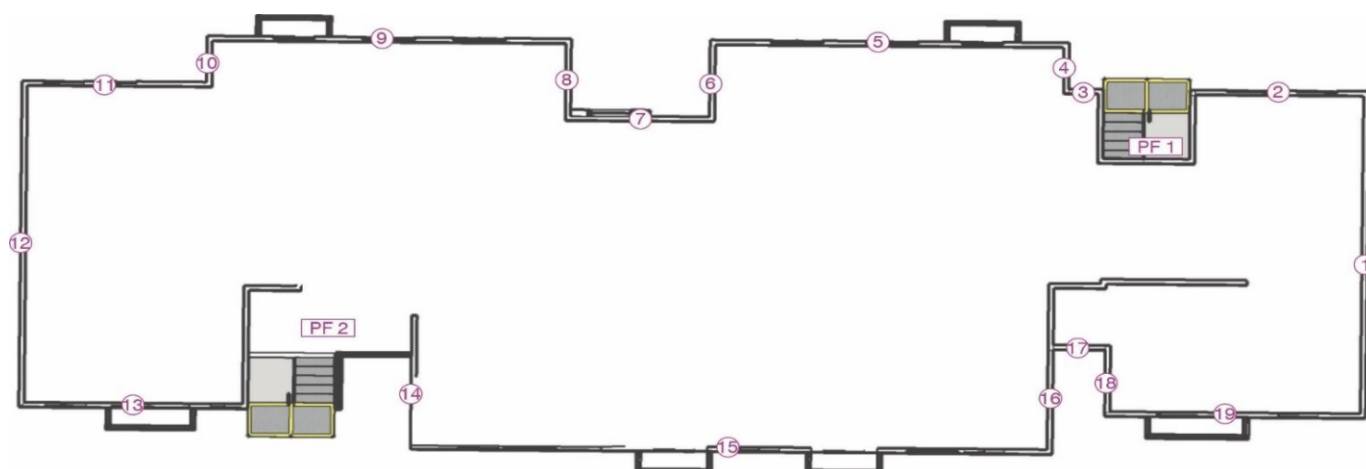


RESANE DE GRANIPLAST

MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST									
FACHADA			AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	1	5	405,06	0,25%	1,00			1,75%	7,10
		6	405,06	0,12%	0,50				
		8	405,06	0,27%	1,10				
		11	405,06	0,37%	1,50				
		14	405,06	1%	3,00				
				1,75%	7,10				
B	2	14	148,13	1,35%	2,00			1,35%	2,00
B	5	2	207,39	0,48%	1,00			9,02%	17,90
B	5	4	207,39	0,58%	1,20				
B	5	5	207,39	0,48%	1,00				
B	5	6	207,39	0,58%	1,20				
B	5	7	207,39	0,48%	1,00				
B	5	8	207,39	0,87%	1,80				
B	5	9	207,39	0,48%	1,00				
B	5	10	207,39	0,48%	1,00				
B	5	11	207,39	0,72%	1,50				
B	5	12	207,39	0,48%	1,00				
B	5	13	207,39	0,58%	1,20				
B	5	14	207,39	0,48%	1,00				
B	5	15	207,39	0,96%	2,00				
				9,02%	17,90				
TOTAL			4458,78	0,61%	27,00	0,0%	0,00	0,61%	27,00

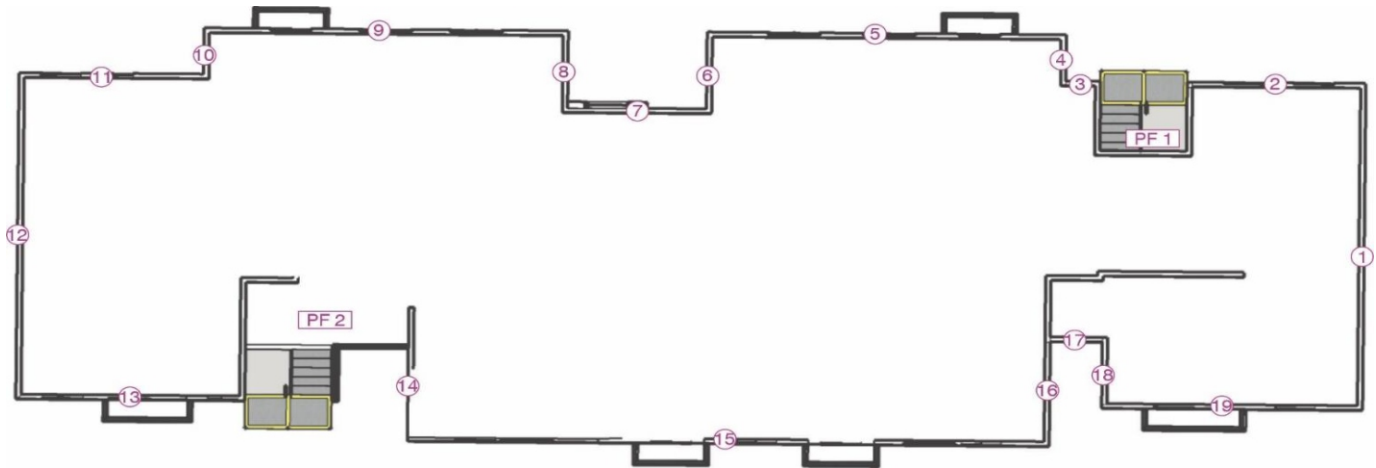


MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA			AREA	SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	6	3	96,25	3,12%	3,00			3,12%	3,00
	7	2 al 15	136,92	5,11%	7,00			5,84%	8,00
		5	136,92	0,73%	1,00				
	8	3	90,48	1,11%	1,00			4,42%	4,00
		6	90,48	1,11%	1,00				
		7	90,48	1,11%	1,00				
		15	90,48	1,11%	1,00				
TOTAL			4458,78	0,34%	15,00	0,0%	0,00	0,34%	15,00

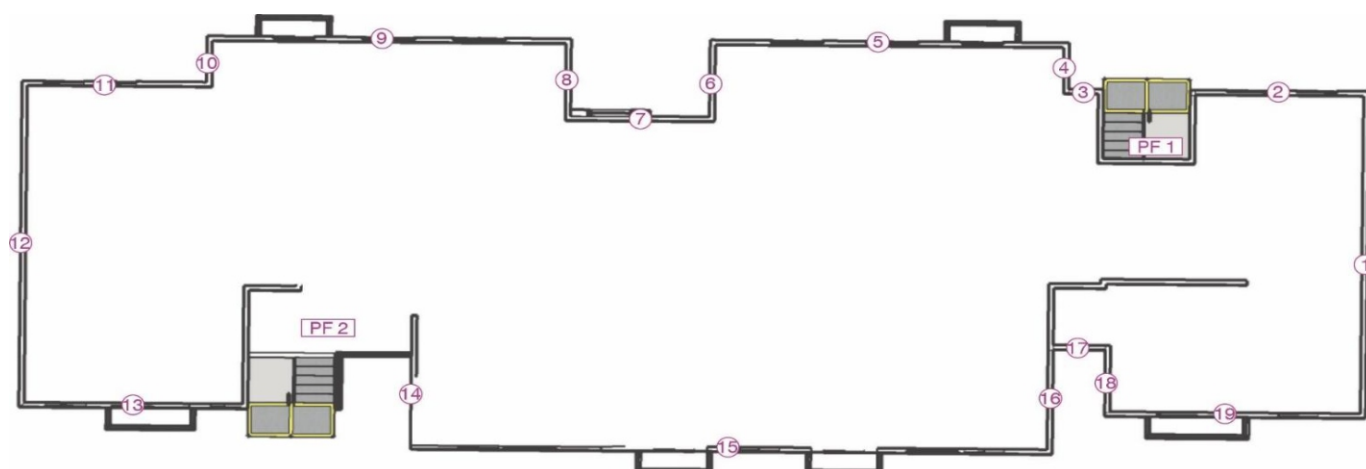


MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST


FACHADA			AREA	SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	9	13	207,39	0,96%	2,00			2,41%	5,00
		10	207,39	0,48%	1,00				
		3	207,39	0,48%	1,00				
		2	207,39	0,48%	1,00				
	10	3	59,68	1,68%	1,00			6,70%	4,00
		2	59,68	1,68%	1,00				
		11	59,68	3,35%	2,00				
	11	11	150,05	1,33%	2,00			3,33%	5,00
		10	150,05	0,67%	1,00				
		4	150,05	0,67%	1,00				
		2	150,05	0,67%	1,00				
	12	14	405,45	0,74%	3,00			4%	16,50
		13	405,45	0,62%	2,50				
		12	405,45	0,74%	3,00				
		11	405,45	0,49%	2,00				
		10	405,45	0,74%	3,00				
		5	405,45	0,49%	2,00				
		3	405,45	0,25%	1,00				
	TOTAL		4458,78	0,68%	30,50	0,0%	0,00	0,68%	30,50

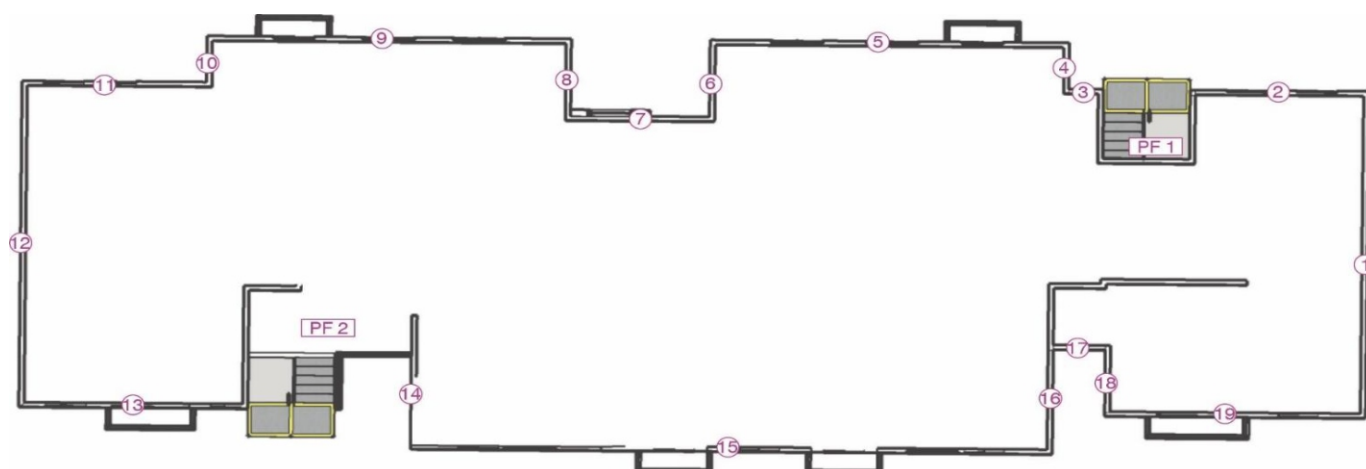

AVANCE DE OBRA - PINTURA DE FACHADA


AVANCE PINTURA DE FACHADA		
TORRE B	62,87%	37,1%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
3053,09	4856,00	1802,91

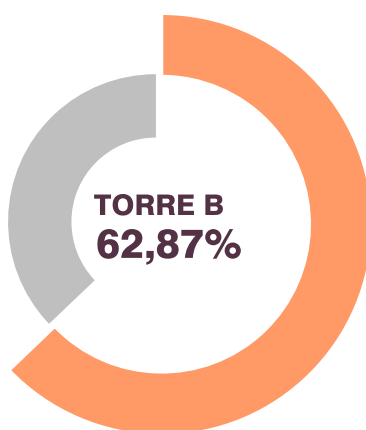


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
23,05%	1119,17




SEMANA 02	M2
28,37%	1377,72



SEMANA 04	M2
0,00%	0,00



SEMANA 03	M2
11,45%	556,20




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADAS


FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	405,06	100%	405,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	405,06
B	2	148,13	0%	0,00	100%	148,13	0%	0,00	100%	148,13
B	PF1	501,62	75%	376,22	25%	125,41	0%	0,00	100%	501,62
B	3	53,96	0%	0,00	100%	53,96	0%	0,00	100%	53,96
B	4	84,70	50%	42,35	50%	42,35	0%	0,00	100%	84,70
B	5	237,09	50%	118,55	50%	118,55	0%	0,00	100%	237,09
B	6	96,25	0%	0,00	100%	96,25	0%	0,00	100%	96,25
B	7	136,92	0%	0,00	50%	68,46	20%	27,38	70%	95,85
B	8	90,48	0%	0,00	50%	45,24	50%	45,24	100%	90,48
B	9	237,09	0%	0,00	50%	118,55	30%	71,13	80%	189,67
B	10	59,68	0%	0,00	50%	29,84	100%	59,68	150%	89,51
B	11	150,05	0%	0,00	0%	0,00	100%	150,05	100%	150,05
B	12	405,45	0%	0,00	0%	0,00	50%	202,72	50%	202,72
B	13	239,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	708,00	25%	177,00	75%	531,00	0%	0,00	100%	708,00
B	14	44,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	686,11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	127,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	54,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	77,59	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	311,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4856,00	23,0%	1119,17	28,4%	1377,72	11,5%	556,20	62,87%	3053,09

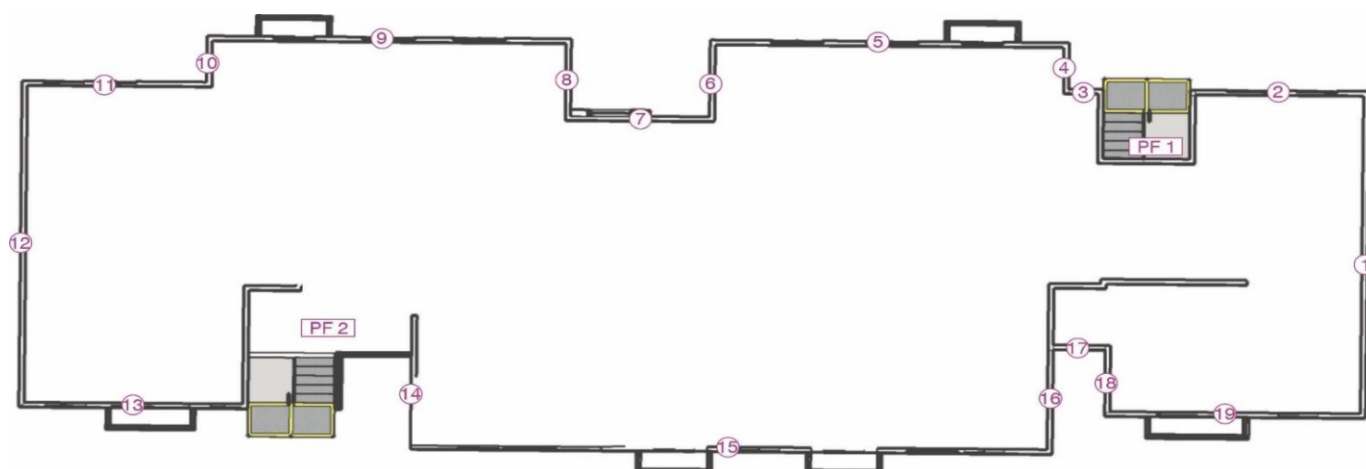

AVANCE DE OBRA - SELLAMIENTO DE VENTANAS


AVANCE SELLAMIENTO VENTANAS		
TORRE B	34,98%	65,0%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
404,49	1156,38	751,88

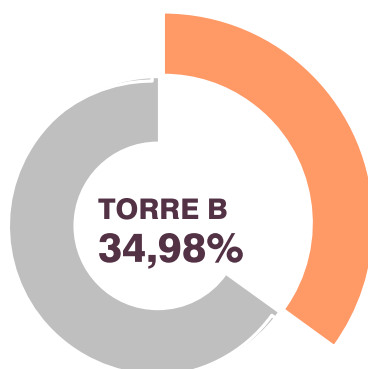


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
26,81%	309,99




SEMANA 02	M2
8,17%	94,50



SEMANA 04	M2
0,00%	0,00



SEMANA 03	M2
4,67%	54,00




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : ML

SELLAMIENTO DE VENTANAS

FACHADA		ML	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	20,25	75%	15,19	0%	0,00	0%	0,00	75%	15,19
B	2	126,00	75%	94,50	0%	0,00	0%	0,00	75%	94,50
B	PF1	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	3	6,08	75%	4,56	0%	0,00	0%	0,00	75%	4,56
B	4	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	5	126,00	75%	94,50	0%	0,00	0%	0,00	75%	94,50
B	6	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	7	62,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	8	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	9	126,00	0%	0,00	75%	94,50	0%	0,00	75%	94,50
B	10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	11	135,00	75%	101,25	0%	0,00	25%	33,75	100%	135,00
B	12	20,25	0%	0,00	0%	0,00	100%	20,25	100%	20,25
B	13	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	14	73,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	315,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	20,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		1156,38	26,8%	309,99	8,2%	94,50	4,7%	54,00	39,65%	458,49

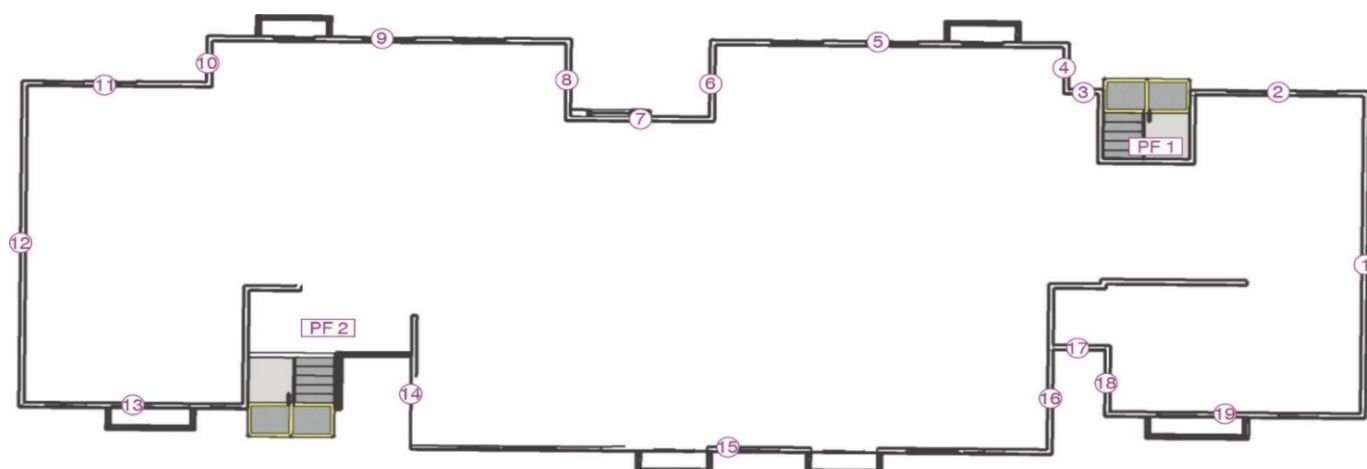

RENDIMIENTO PERSONAL



ACTIVIDADES REALIZADAS | AVANCE DE OBRA | SEMANA 3

EMILIO ÁLVAREZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTES	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	68,47	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	Colocación de hilo plumada, cambio de fraja
JUEVES	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	22,62	Resane parte inferior de alfaja
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	
SÁBADO	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	19,00	0,00	15,00	0,00	221,56	

SEBASTIÁN CARDONA

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTES	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
MIÉRCOLES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	59,27	
JUEVES	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	
SÁBADO	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18,00	18,00	135,00	0,00	15,00	127,99	

JOHAN BERMÚDEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Ozono
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Ozono
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Ozono
VIERNES	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	7,00	0,00	0,00	0,00	15,00	50,63	

JHONATAN BENÍTEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARTES	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	22,62	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	42,68	
JUEVES	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	73,25	
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	0,00	3,00	270,00	30,00	30,00	138,54	

INVENTARIO DE MATERIALES

Agosto 24 del 2024

INVENTARIO MATERIALES ORO NEGRO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	IMPATEXTURA ACRILICO CUÑETE
4	ACRONAL 50% TEXILAN GALÓN
8	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - NIEVE EN LOS ALPES
11,5	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - GRIS BASALTO
4	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - FINAS HIERBAS
10	RODILLO ANTIGOTA EXTERIOR 9 PINTUCO
5	FELPA ANTIGOTA EXTERIOR 9"
0,5	ICOLATEX MAT BLANCO
4,5	ESTUCA PAÑETE SIKA X 25KG
3	CINTAS ENMASCARAR
13	BROCHAS DE 2"
