



A CERCA DEL AVANCE SEMANA 04

En el transcurso de la semana 4 de trabajo en el Parque Residencial Oro Negro Atardecer, el equipo de trabajo FRESH HOUSE, intensificó la de ejecución de la actividad de Instalación de cortagotera en parte inferior de balcones, puesto que era la actividad que indicaba la ruta crítica de la programación. Las cantidades ejecutadas de dicho ítem queda en 90/24 es decir resta un 70% por realizar.

A continuación se adjunta la información del avance de obra de la semana 04 y el acumulado hasta la fecha.

ELABORADO POR
ALEXIS BETANCOURT



**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4856,00	44%	2138,56	16%	770,46	8%	405,45	0%	0	68,3%	3314,47
TOTAL	4856,00	44,04%	2138,56	15,87%	770,46	8,35%	405,45	0%	0	68,26%	3314,47

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0,68%	30,50	0%	0	1,6%	72,50
TOTAL	4458,78	0,61%	27,00	0,34%	15,00	0,68%	30,50	0%	0	1,63%	72,50

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADA

FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	4684,31	20%	949,89	28%	1314,49	13,02%	609,79	6,3%	293,64	67,6%	3167,80
TOTAL	4684,31	20,28%	949,89	28,06%	1314,49	13,02%	609,79	6,3%	293,638	67,63%	3167,80

**MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO**

UNIDAD : M2

SELLAMIENTO DE VENTANAS


FACHADA	ÁREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1156,38	27%	309,99	8%	94,50	4,67%	54,00	0%	0	39,6%	458,49
TOTAL	1156,38	26,81%	309,99	8,17%	94,50	4,67%	54,00	0%	0	39,65%	458,49

AVANCE DE OBRA - LAVADO DE FACHADA

AVANCE LAVADO DE FACHADA

TORRE B 68,26% 31,7%


CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
3314,47	4856,00	1541,53

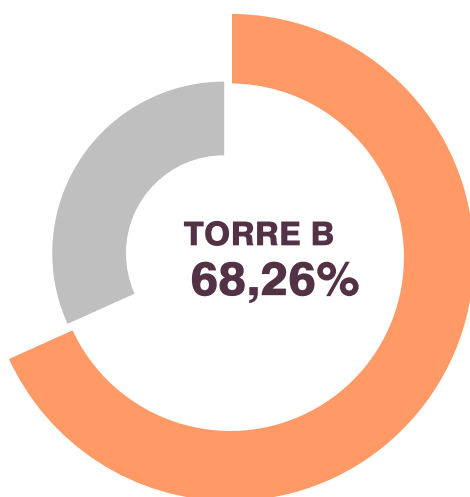

PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01 M2

44,04% 2138,56

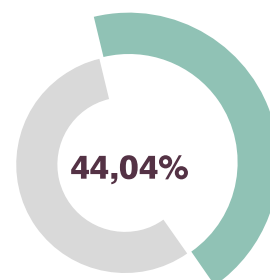


SEMANA 02 M2

15,87% 770,46

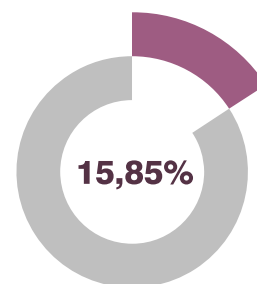


SEMANA 04 M2

0,00% 0,00



SEMANA 03 M2

8,35% 405,45




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

LAVADO DE FACHADAS

FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	405,06	100%	405,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	405,06
B	2	148,13	100%	148,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	148,13
B	PF1	501,62	100%	501,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	501,62
B	3	53,96	100%	53,96	0%	0,00	0%	0,00	100%	53,96
B	4	84,70	100%	84,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	84,70
B	5	237,09	100%	237,09	0%	0,00	0%	0,00	100%	237,09
B	6	96,25	0%	0,00	100%	96,25	0%	0,00	100%	96,25
B	7	136,92	0%	0,00	100%	136,92	0%	0,00	100%	136,92
B	8	90,48	0%	0,00	100%	90,48	0%	0,00	100%	90,48
B	9	237,09	0%	0,00	100%	237,09	0%	0,00	100%	237,09
B	10	59,68	0%	0,00	100%	59,68	0%	0,00	100%	59,68
B	11	150,05	0%	0,00	100%	150,05	0%	0,00	100%	150,05
B	12	405,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	405,45	0%	405,45
B	13	239,82	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	708,00	100%	708,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	708,00
B	14	44,35	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	686,11	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	127,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	54,38	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	77,59	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	311,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4856,00	44,0%	2138,56	15,9%	770,46	19,0%	405,45	68%	3314,47

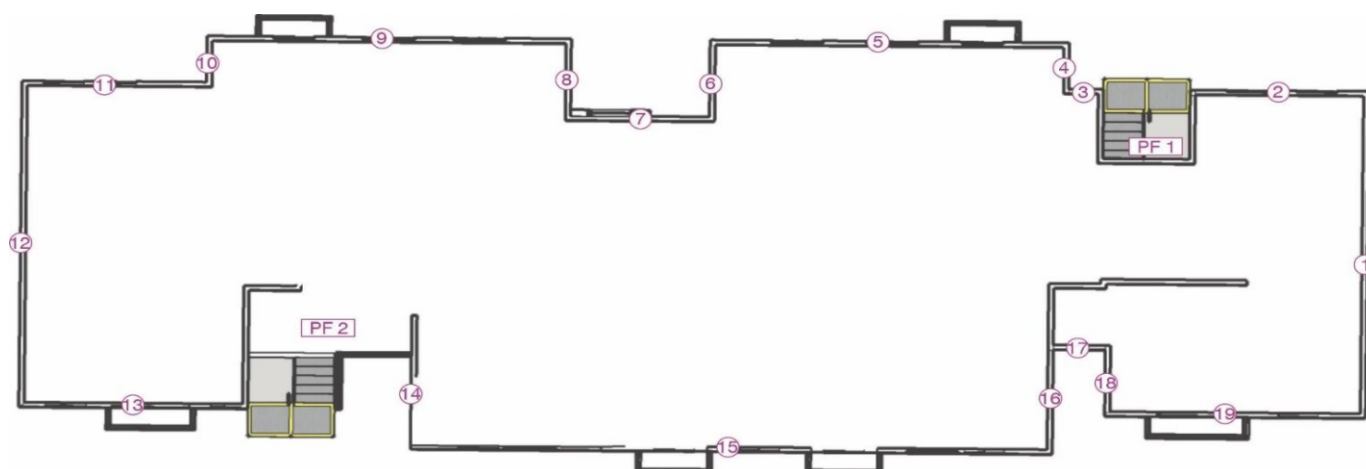


RESANE DE GRANIPLAST

MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA			AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	1	5	405,06	0,25%	1,00			1,75%	7,10
		6	405,06	0,12%	0,50				
		8	405,06	0,27%	1,10				
		11	405,06	0,37%	1,50				
		14	405,06	1%	3,00				
				1,75%	7,10				
B	2	14	148,13	1,35%	2,00			1,35%	2,00
B	5	2	207,39	0,48%	1,00			9,02%	17,90
B	5	4	207,39	0,58%	1,20				
B	5	5	207,39	0,48%	1,00				
B	5	6	207,39	0,58%	1,20				
B	5	7	207,39	0,48%	1,00				
B	5	8	207,39	0,87%	1,80				
B	5	9	207,39	0,48%	1,00				
B	5	10	207,39	0,48%	1,00				
B	5	11	207,39	0,72%	1,50				
B	5	12	207,39	0,48%	1,00				
B	5	13	207,39	0,58%	1,20				
B	5	14	207,39	0,48%	1,00				
B	5	15	207,39	0,96%	2,00				
				9,02%	17,90				
TOTAL			4458,78	0,61%	27,00	0,0%	0,00	0,61%	27,00

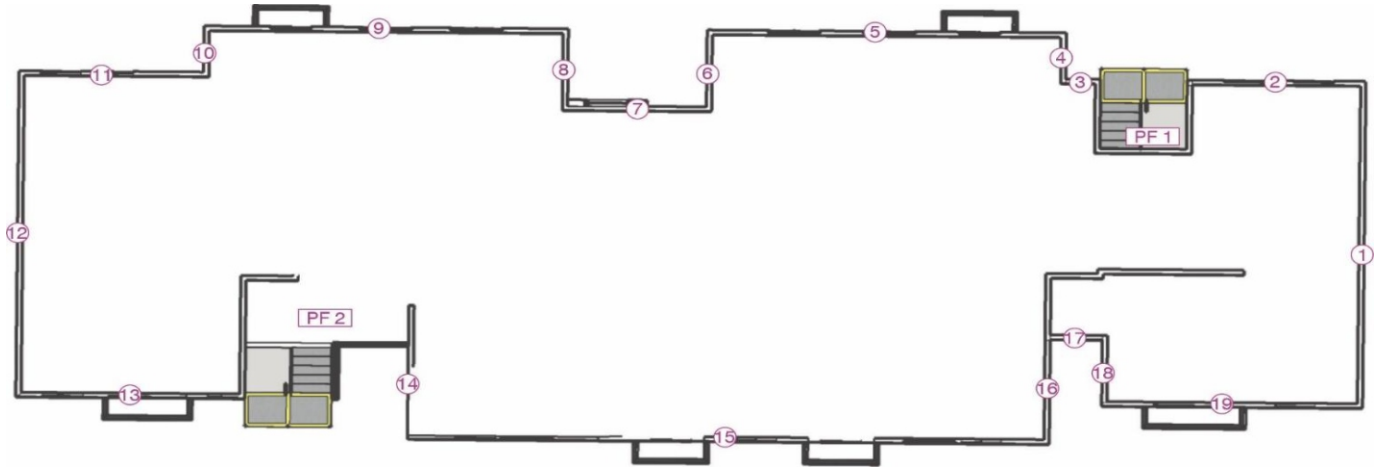


MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST

FACHADA			AREA	SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	6	3	96,25	3,12%	3,00			3,12%	3,00
	7	2 al 15	136,92	5,11%	7,00			5,84%	8,00
		5	136,92	0,73%	1,00				
	8	3	90,48	1,11%	1,00			4,42%	4,00
		6	90,48	1,11%	1,00				
		7	90,48	1,11%	1,00				
		15	90,48	1,11%	1,00				
TOTAL			4458,78	0,34%	15,00	0,0%	0,00	0,34%	15,00

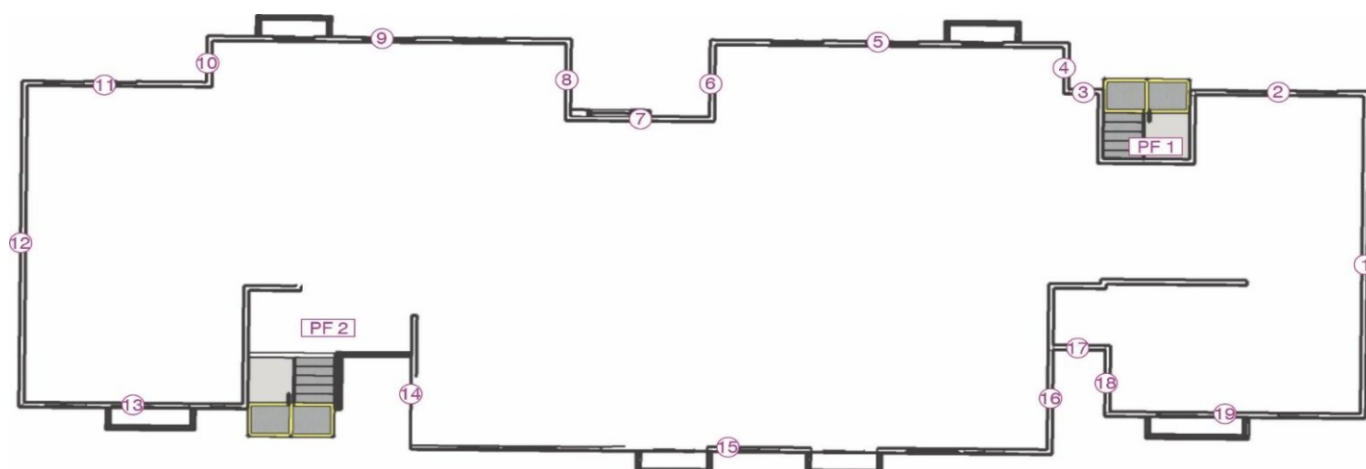


MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

RESANE DE GRANIPLAST


FACHADA			AREA	SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN	PISO		%	CANT	%	CANT		
B	9	13	207,39	0,96%	2,00			2,41%	5,00
		10	207,39	0,48%	1,00				
		3	207,39	0,48%	1,00				
		2	207,39	0,48%	1,00				
	10	3	59,68	1,68%	1,00			6,70%	4,00
		2	59,68	1,68%	1,00				
		11	59,68	3,35%	2,00				
	11	11	150,05	1,33%	2,00			3,33%	5,00
		10	150,05	0,67%	1,00				
		4	150,05	0,67%	1,00				
		2	150,05	0,67%	1,00				
	12	14	405,45	0,74%	3,00			4%	16,50
		13	405,45	0,62%	2,50				
		12	405,45	0,74%	3,00				
		11	405,45	0,49%	2,00				
		10	405,45	0,74%	3,00				
		5	405,45	0,49%	2,00				
		3	405,45	0,25%	1,00				
	TOTAL		4458,78	0,68%	30,50	0,0%	0,00	0,68%	30,50

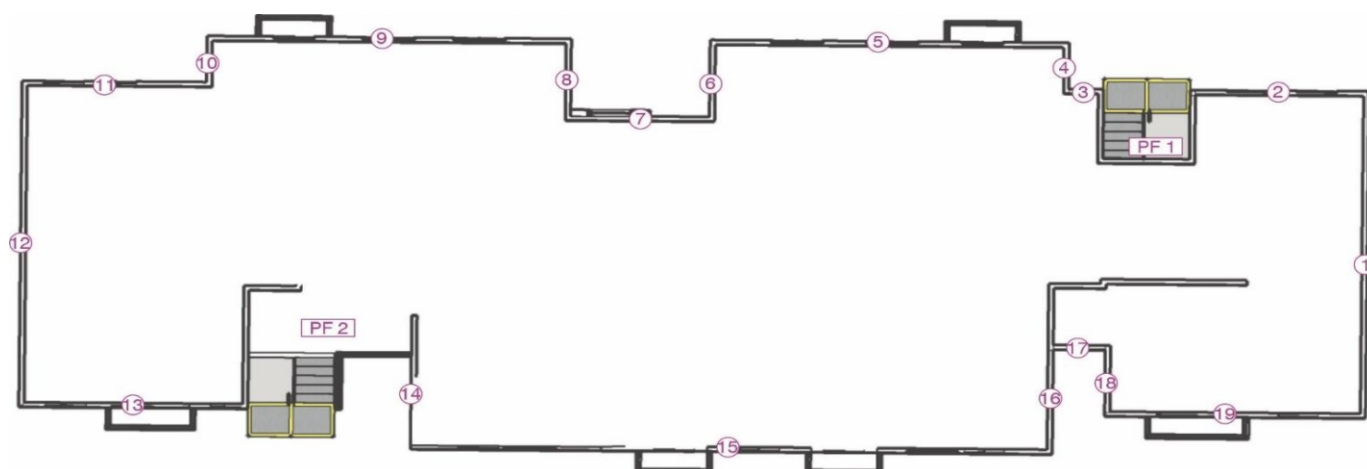

AVANCE DE OBRA - PINTURA DE FACHADA


AVANCE PINTURA DE FACHADA		
TORRE B	67,63%	32,4%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
3167,80	4684,31	1516,51

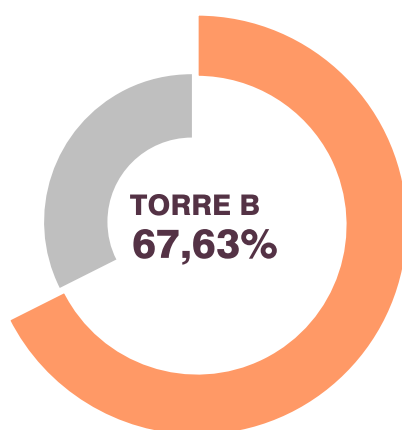


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
20,28%	949,89




SEMANA 02	M2
28,06%	1314,49



SEMANA 04	M2
6,27%	293,64



SEMANA 03	M2
13,02%	609,79




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : M2

PINTURA DE FACHADAS


FACHADA		AREA	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	366,56	100%	366,56	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	366,56
B	2	179,31	0%	0,00	100%	179,31	0%	0,00	0%	0,00	100%	179,31
B	PF1	400,00	75%	300,00	25%	100,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	400,00
B	3	34,71	0%	0,00	100%	34,71	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,71
B	4	57,75	50%	28,88	50%	28,88	0%	0,00	0%	0,00	100%	57,75
B	5	263,27	50%	131,64	50%	131,64	0%	0,00	0%	0,00	100%	263,27
B	6	161,70	0%	0,00	100%	161,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	161,70
B	7	191,57	0%	0,00	50%	95,79	20%	38,31	30%	57,47	100%	191,57
B	8	103,95	0%	0,00	50%	51,98	50%	51,98	0%	0,00	100%	103,95
B	9	264,43	0%	0,00	50%	132,21	30%	79,33	20%	52,89	100%	264,43
B	10	59,68	0%	0,00	50%	29,84	50%	29,84	0%	0,00	100%	59,68
B	11	227,05	0%	0,00	0%	0,00	100%	227,05	0%	0,00	100%	227,05
B	12	366,56	0%	0,00	0%	0,00	50%	183,28	50%	183,28	100%	366,56
B	13	243,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	491,26	25%	122,82	75%	368,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	491,26
B	14	56,67	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	673,79	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	124,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	43,13	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	79,46	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	295,29	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		4684,31	20,3%	949,89	28,1%	1314,49	13,0%	609,79	30,9%	293,64	67,63%	3167,80

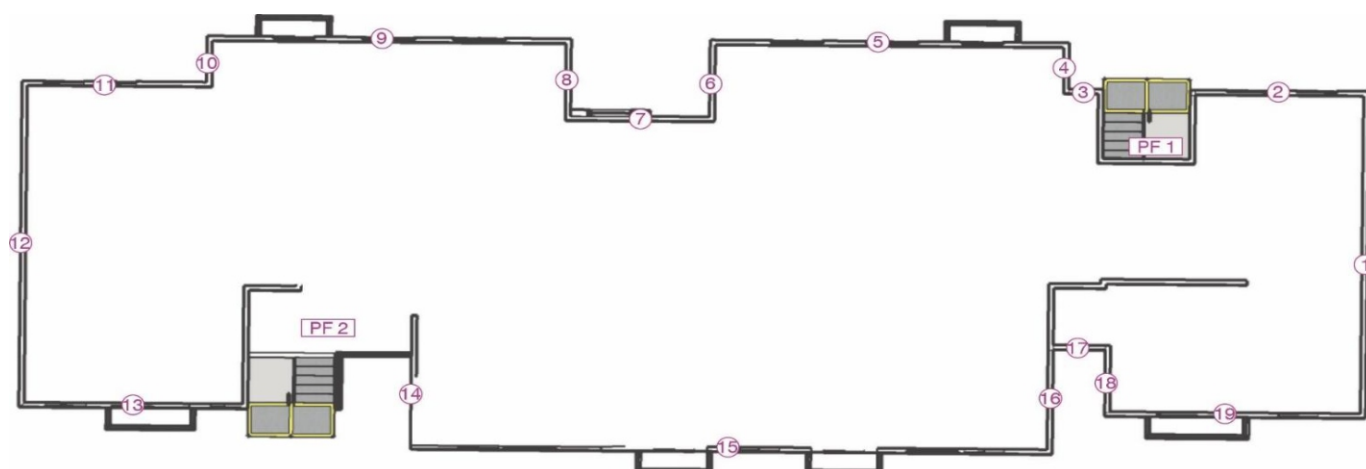

AVANCE DE OBRA - SELLAMIENTO DE VENTANAS


AVANCE SELLAMIENTO VENTANAS		
TORRE B	34,98%	65,0%

CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD PENDIENTE
404,49	1156,38	751,88

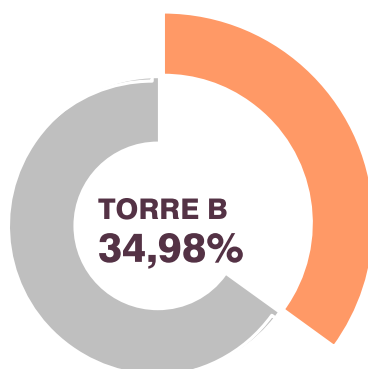


PORCENTAJE ACUMULADO


SEMANA 01	M2
26,81%	309,99




SEMANA 02	M2
8,17%	94,50



SEMANA 04	M2
0,00%	0,00



SEMANA 03	M2
4,67%	54,00




MEMORIA DE CALCULO - AVANCE DE OBRA
ORO NEGRO TORRE B - 2024

UNIDAD : ML

SELLAMIENTO DE VENTANAS

FACHADA		ML	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		ACUMULADO	TOTAL PARCIAL
TORRE	SECCIÓN		%	CANT	%	CANT	%	CANT		
B	1	20,25	75%	15,19	0%	0,00	0%	0,00	75%	15,19
B	2	126,00	75%	94,50	0%	0,00	0%	0,00	75%	94,50
B	PF1	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	3	6,08	75%	4,56	0%	0,00	0%	0,00	75%	4,56
B	4	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	5	126,00	75%	94,50	0%	0,00	0%	0,00	75%	94,50
B	6	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	7	62,40	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	8	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	9	126,00	0%	0,00	75%	94,50	0%	0,00	75%	94,50
B	10	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	11	135,00	75%	101,25	0%	0,00	25%	33,75	100%	135,00
B	12	20,25	0%	0,00	0%	0,00	100%	20,25	100%	20,25
B	13	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	PF2	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	14	73,15	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	15	315,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	16	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	17	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	18	20,25	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
B	19	63,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		1156,38	26,8%	309,99	8,2%	94,50	4,7%	54,00	39,65%	458,49

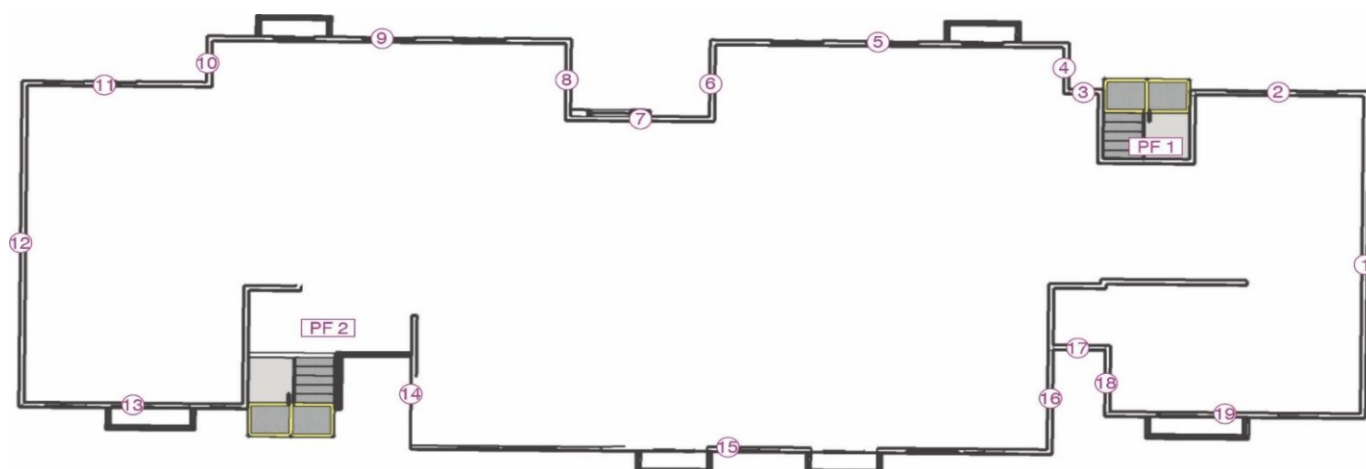

RENDIMIENTO DEL PERSONAL



ACTIVIDADES REALIZADAS | AVANCE DE OBRA | SEMANA 4

EMILIO ÁLVAREZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	61,00	Instalación de cortagotera y empastada (80%)
MARTES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde
MIÉRCOLES	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde, en compañía
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde, en compañía
	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	24,00	61,00	

SEBASTIÁN CARDONA

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	Permiso de medio día
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	Metros de pintura lineales Estuvo en obra Papiro después de medio día
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,00	

JOHAN BERMÚDEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
MARTES	0,00	1,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro después de medio día
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estuvo en obra Papiro
	0,00	1,00	0,00	0,00	12,00		68,00	

JHONATAN BENÍTEZ

JORNAL	PASTA NIVELACIÓN (M2)	RESANES GRANIPLAST (M2)	LAVADO DE FACHADA (M2)	SELLO DE VENTANAS (UND)	LIMPIEZA DE VENTANAS (UND)	INSTALACIÓN CORTAGOTERA	PINTURA (M2)	OBSERVACIONES
LUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No asistió
MARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	58,00	
MIÉRCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
JUEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00	
VIERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde, en compañía
SÁBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	Instalación de cortagotera y empastada borde, en compañía
	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	15,00	58,00	

INVENTARIO DE MATERIALES

INVENTARIO MATERIALES ORO NEGRO	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	IMPATEXTURA ACRILICO CUÑETE
4	ACRONAL 50% TEXILAN GALÓN
6	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - NIEVE EN LOS ALPES
11,5	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - GRIS BASALTO
4	KORAZA PRO 550 BASE DEEP 05 - FINAS HIERBAS
10	RODILLO ANTIGOTA EXTERIOR 9 PINTUCO
5	FELPA ANTIGOTA EXTERIOR 9"
0,5	ICOLATEX MAT BLANCO
4,5	ESTUCA PAÑETE SIKA X 25KG
3	CINTAS ENMASCARAR
13	BROCHAS DE 2"
