


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	20 jul '25	27 jul '25	3 ago '25	10 ago '25	17 ago '25	24 ago '25	31 ago '25	7 sep '25	14 sep '25
1		PROYECTO DE MANTENIMIENTO EL MIRADOR	45 días	lun 4/08/25	sáb 13/09/25										
2		MANTENIMIENTO TORRE	45 días	lun 4/08/25	sáb 13/09/25										
3		PRELIMINARES DE OBRA	2 días	lun 4/08/25	mar 5/08/25										
4		Campamento de Obra	1 día	lun 4/08/25	mar 5/08/25										
5		Señalización y Seguridad	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	4									
6		PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	17 días	mar 5/08/25	mié 20/08/25										
7		Lavado General de Areas a Intervenir	11 días	mar 5/08/25	jue 14/08/25	4									
8		Suministro y restitución de graniplast (25%)	13 días	vie 8/08/25	mié 20/08/25	7CC+4 días									
9		Suministro y restitución de mortero de fachada (10% 2.2)	7 días	mié 6/08/25	mié 13/08/25	4FC+2 días									
10		PINTURA DE FACHADA	21 días	sáb 16/08/25	jue 4/09/25										
11		Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza de Pintuco, en fachadas de concreto con revestimiento de graniplast	16 días	sáb 16/08/25	sáb 30/08/25	7FC+2 días									
12		Suministro y aplicación de pintura de impermeabilización, tipo koraza sol y lluvia, sobre paredes en concreto limpio en fachadas	2 días	sáb 30/08/25	mar 2/09/25	11									
13		Suministro y aplicación de Pintura gris basalto sobre alfajias de muros en los accesos del edificio y garajes	1 día	sáb 30/08/25	lun 1/09/25	12CC									
14		Suministro y aplicación de Pintura, del tipo Pintulux 3 en 1 de Pintuco, en puertas y ventanas de fachada	2 días	mar 2/09/25	mié 3/09/25	12;13									
15		Suministro y aplicación de Pintura, del tipo Pintulux 3 en 1 de Pintuco en barandas de parqueaderos	1 día	mié 3/09/25	jue 4/09/25	14									
16		Suministro y aplicación de Pintura en interiores - paredes y cielo raso de pasillos y portería	5 días	mié 20/08/25	dom 24/08/25	8									
17		REPARACIONES Y PROTECCIONES ESPECIALES	23 días	vie 8/08/25	vie 29/08/25										
18		Suministro e instalación de cortagoteras en fachadas y balcones	8 días	mié 13/08/25	mié 20/08/25	9									
19		Retiro y Reposicion de sello en elementos vidriados de las areas comunes y fachadas del edificio (60%)	7 días	vie 8/08/25	jue 14/08/25	8CC									
20		Sellamiento de elementos varios en balcones	2 días	vie 8/08/25	sáb 9/08/25	8CC									
21		Suministro e instalación de alfajias en lamina en el perimetro y muros medianeros de las cubiertas del edificio	3 días	mié 20/08/25	sáb 23/08/25	18;19;20									
22		Conformación de escurrideros en antepechos de balcones y en otros elementos de la fachada	2 días	sáb 23/08/25	dom 24/08/25	16FC-2 días									
23		Impermeabilización de muros internos en las cubiertas del edificio	5 días	lun 25/08/25	vie 29/08/25	16									
24		CUBIERTAS	8 días	jue 4/09/25	jue 11/09/25										
25		Retiro de cubiertas antiguas y suministro e instalación de cubiertas Nuevas en Fibrocemento	8 días	jue 4/09/25	jue 11/09/25	23;15									
26		Suministro e instalación de teja translucida en vacio del edificio	1 día	sáb 6/09/25	sáb 6/09/25	25CC+2 días									
27		Impermeabilización de la placa del cuarto de maquinas	1 día	sáb 6/09/25	lun 8/09/25	26									
28		Impermeabilización y tratamiento general a la viga canal de cubierta	1 día	lun 8/09/25	mar 9/09/25	27									
29		ASEO GENERAL DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	vie 12/09/25	sáb 13/09/25										
30		Aseo General y Retiro de Escombros y Sobrantes	1 día	vie 12/09/25	vie 12/09/25	26;27;28;25									
31		Retiro de escombros y disposición final	1 día	vie 12/09/25	sáb 13/09/25	30									

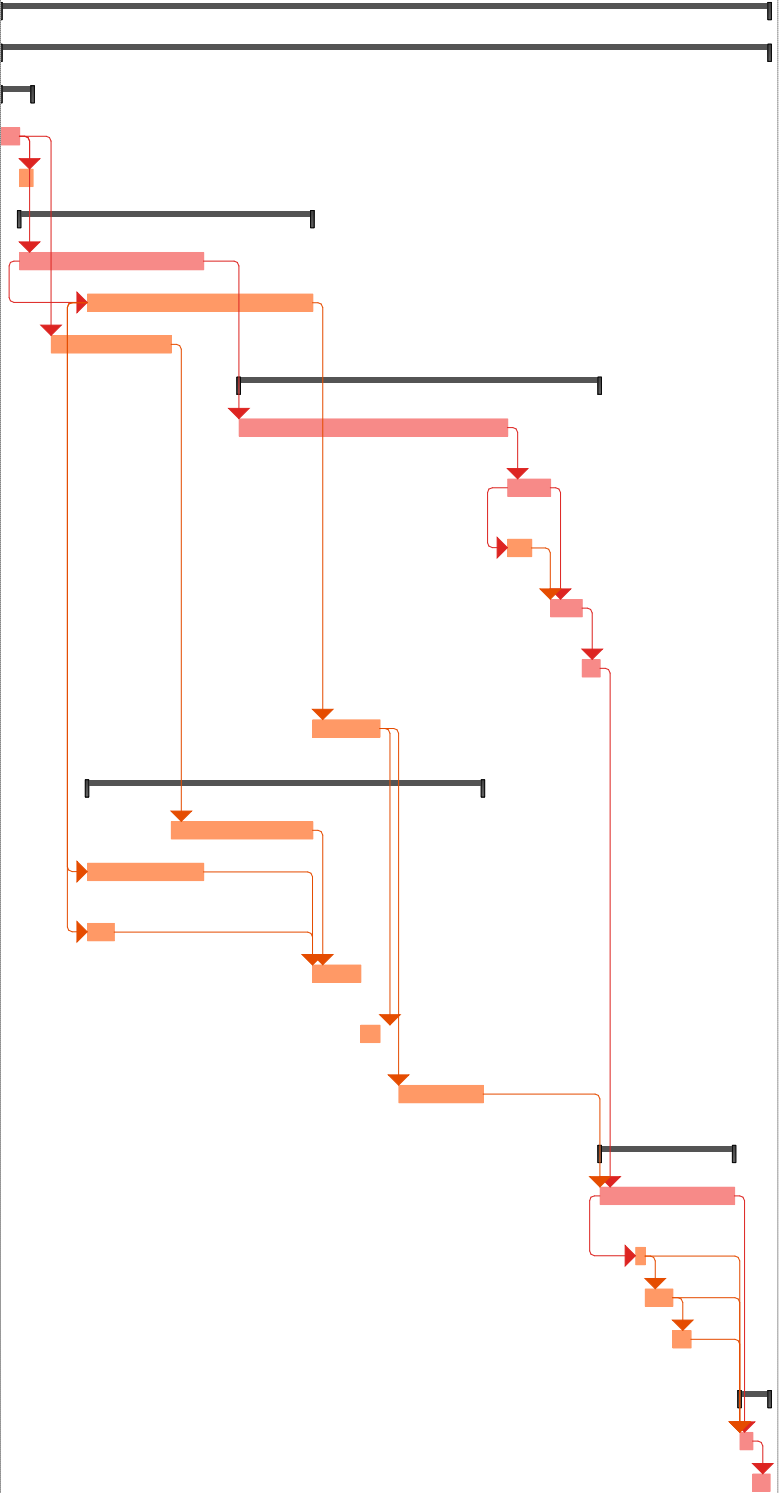

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: jue 5/06/25

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	

Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	

Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	

Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	

Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	

Tarea inactiva	
Hito inactivo	
Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

[]

[]

[]

[]

[]

Hito externo	
Fecha límite	
Tareas críticas	
División crítica	
Progreso	

Hito externo	
Fecha límite	
Tareas críticas	
División crítica	
Progreso	

Hito externo	
Fecha límite	
Tareas críticas	
División crítica	
Progreso	

Hito externo	
Fecha límite	
Tareas críticas	
División crítica	
Progreso	

Hito externo	
Fecha límite	
Tareas críticas	
División crítica	
Progreso	

A diagram showing a vertical sequence of elements: a grey diamond at the top, followed by a green arrow pointing downwards, then a solid red horizontal bar, a dotted red horizontal bar, and finally a solid blue horizontal bar at the bottom.

A diagram showing a vertical sequence of elements: a grey diamond at the top, followed by a green arrow pointing downwards, then a solid red horizontal bar, a dotted red horizontal bar, and finally a solid blue horizontal bar at the bottom.

A diagram showing a vertical sequence of elements: a grey diamond at the top, followed by a green arrow pointing downwards, then a solid red horizontal bar, a dotted red horizontal bar, and finally a solid blue horizontal bar at the bottom.

A diagram showing a vertical sequence of elements: a grey diamond at the top, followed by a green arrow pointing downwards, then a solid red horizontal bar, a dotted red horizontal bar, and finally a solid blue horizontal bar at the bottom.

A diagram showing a vertical sequence of elements: a grey diamond at the top, followed by a green arrow pointing downwards, then a solid red horizontal bar, a dotted red horizontal bar, and finally a solid blue horizontal bar at the bottom.

Progreso manual

Progreso manual

Progreso manual

Progreso manual

Progreso manual
