



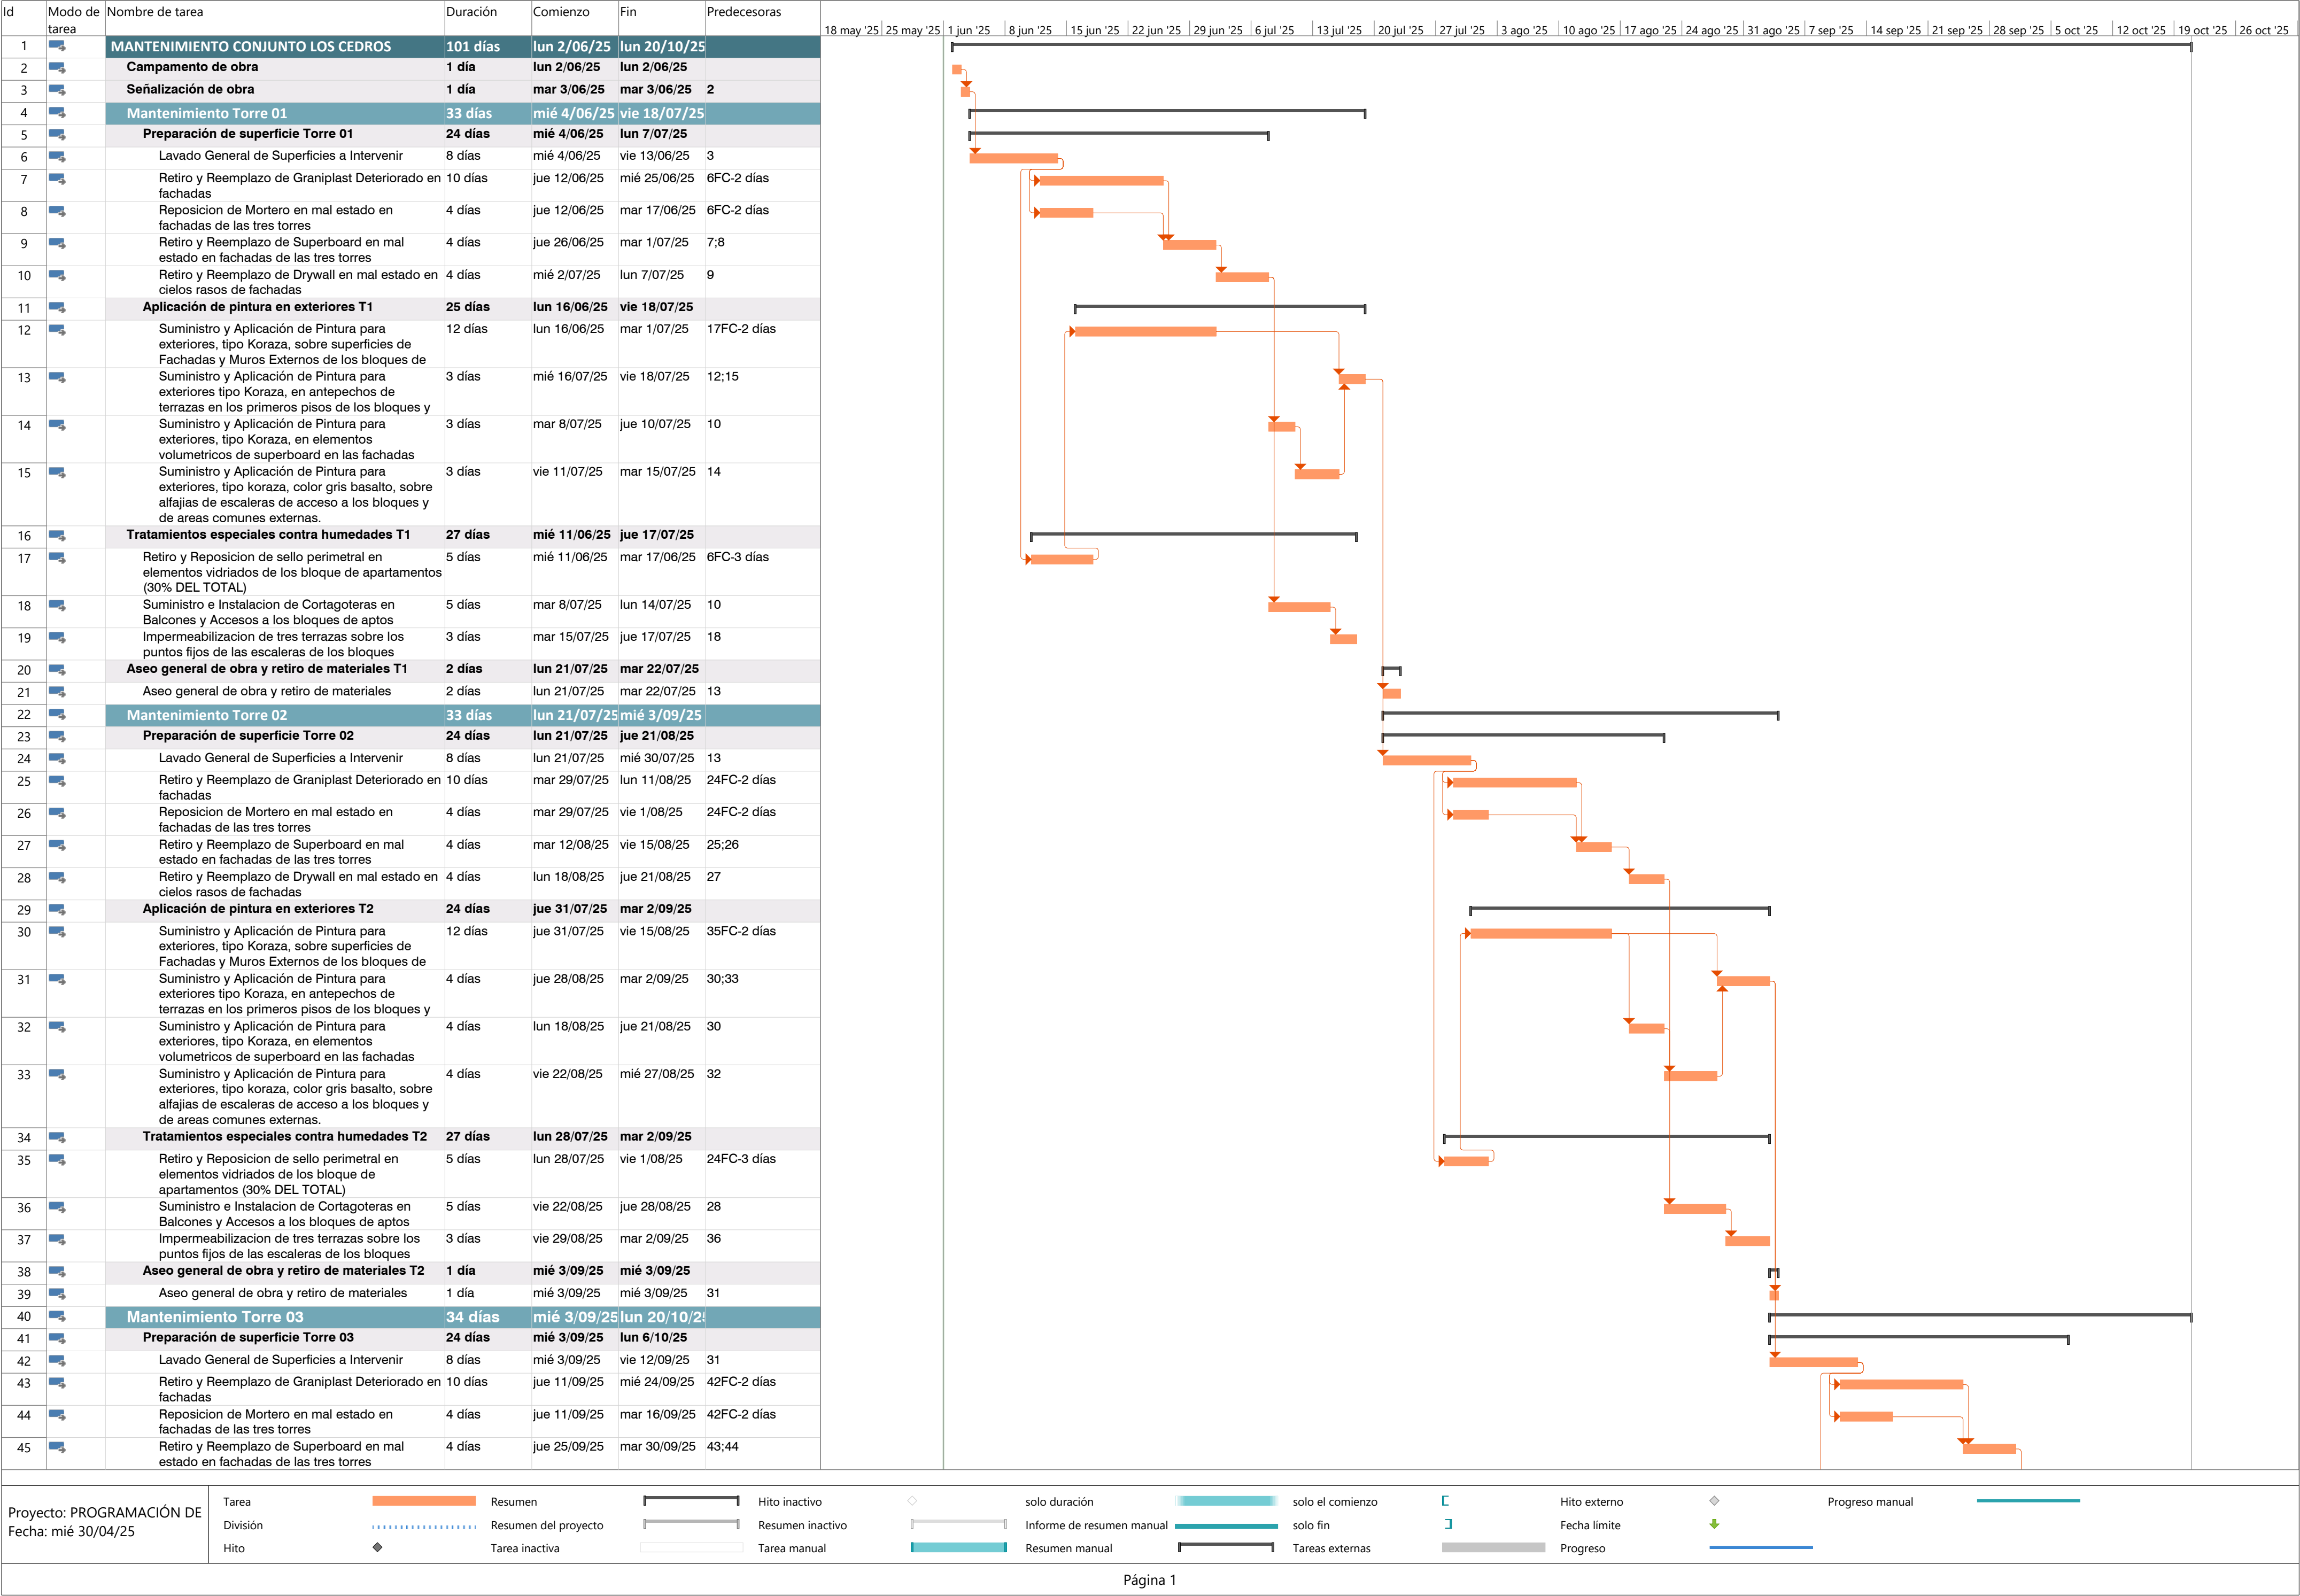

Página 1

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																												
							18 may '25	25 may '25	1 jun '25	8 jun '25	15 jun '25	22 jun '25	29 jun '25	6 jul '25	13 jul '25	20 jul '25	27 jul '25	3 ago '25	10 ago '25	17 ago '25	24 ago '25	31 ago '25	7 sep '25	14 sep '25	21 sep '25	28 sep '25	5 oct '25	12 oct '25	19 oct '25	26 oct '25				
46		Retiro y Reemplazo de Drywall en mal estado en cielos rasos de fachadas	4 días	mié 1/10/25	lun 6/10/25	45																												
47		Aplicación de pintura en exteriores T3	25 días	lun 15/09/25	vie 17/10/25																													
48		Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, sobre superficies de Fachadas y Muros Externos de los bloques de	12 días	lun 15/09/25	mar 30/09/25	53FC-2 días																												
49		Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores tipo Koraza, en antepechos de terrazas en los primeros pisos de los bloques y	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	48;51																												
50		Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo Koraza, en elementos volumetricos de superboard en las fachadas	3 días	mar 7/10/25	jue 9/10/25	46																												
51		Suministro y Aplicación de Pintura para exteriores, tipo koraza, color gris basalto, sobre alfajias de escaleras de acceso a los bloques y de areas comunes externas.	3 días	vie 10/10/25	mar 14/10/25	50																												
52		Tratamientos especiales contra humedades T3	27 días	mié 10/09/25	jue 16/10/25																													
53		Retiro y Reposicion de sello perimetral en elementos vidriados de los bloque de apartamentos (30% DEL TOTAL)	5 días	mié 10/09/25	mar 16/09/25	42FC-3 días																												
54		Suministro e Instalacion de Cortagoteras en Balcones y Accesos a los bloques de aptos	5 días	mar 7/10/25	lun 13/10/25	46																												
55		Impermeabilizacion de tres terrazas sobre los puntos fijos de las escaleras de los bloques	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	54																												
56		Aseo general de obra y retiro de materiales T3	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25																													
57		Aseo general de obra y retiro de materiales	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	49																												

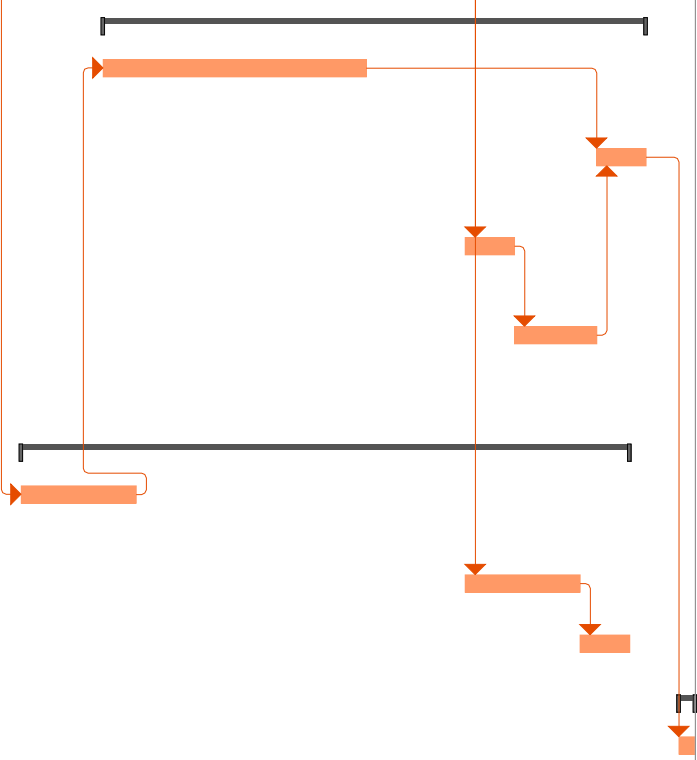

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: mié 30/04/25


Tarea
División
Hito



Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva



Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual



solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual



solo el comienzo
solo fin
Tareas externas



Hito externo
Fecha límite
Progreso



Progreso manual

