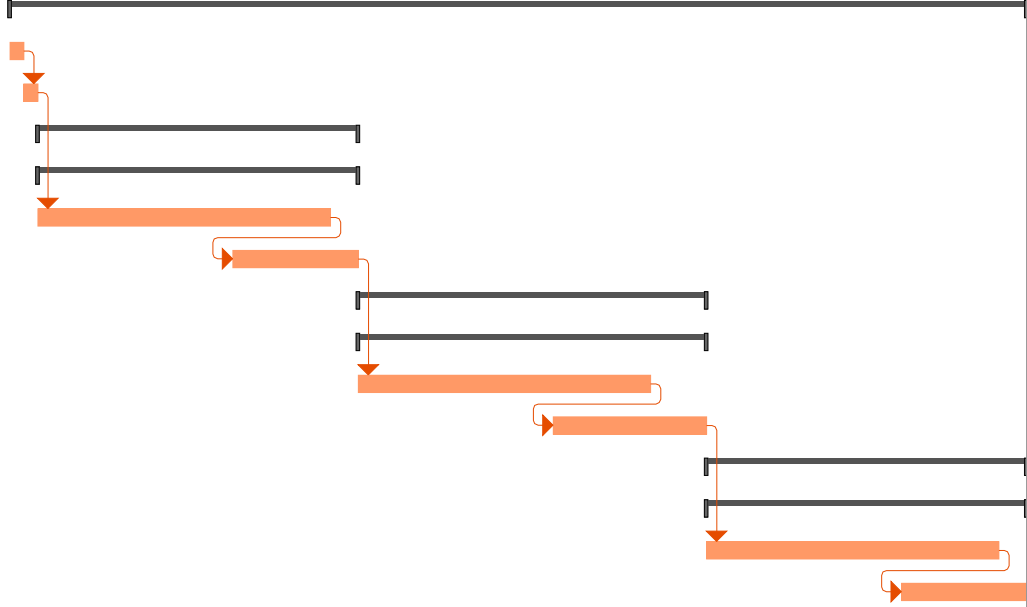


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	18 may '25 25 may '25 1 jun '25 8 jun '25 15 jun '25 22 jun '25 29 jun '25 6 jul '25 13 jul '25 20 jul '25 27 jul '25 3 ago '25 10 ago '25 17 ago '25 24 ago '25														
1			MANTENIMIENTO CONJUNTO LOS CEDROS	53 días	lun 2/06/25	mié 13/08/25																
2			Campamento de obra	1 día	lun 2/06/25	lun 2/06/25																
3			Señalización de obra	1 día	mar 3/06/25	mar 3/06/25	2															
4			Mantenimiento áreas interiores	17 días	mié 4/06/25	jue 26/06/25																
5			Interiores Torre 01	17 días	mié 4/06/25	jue 26/06/25																
6			Resane de superficie	15 días	mié 4/06/25	mar 24/06/25	3															
7			Pintura de superficie	7 días	mié 18/06/25	jue 26/06/25	6FC-5 días															
8			Mantenimiento áreas interiores	17 días	vie 27/06/25	lun 21/07/25																
9			Interiores Torre 02	17 días	vie 27/06/25	lun 21/07/25																
10			Resane de superficie	15 días	vie 27/06/25	jue 17/07/25	7															
11			Pintura de superficie	7 días	vie 11/07/25	lun 21/07/25	10FC-5 días															
12			Mantenimiento áreas interiores	17 días	mar 22/07/25	mié 13/08/25																
13			Interiores Torre 03	17 días	mar 22/07/25	mié 13/08/25																
14			Resane de superficie	15 días	mar 22/07/25	lun 11/08/25	11															
15			Pintura de superficie	7 días	mar 5/08/25	mié 13/08/25	14FC-5 días															

Proyecto: PROGRMACIÓN DE O
Fecha: mié 21/05/25

Tarea

División

Hito

Resumen









Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo









Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual









solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo







Fecha límite

Progreso

Progreso manual







Página 1
